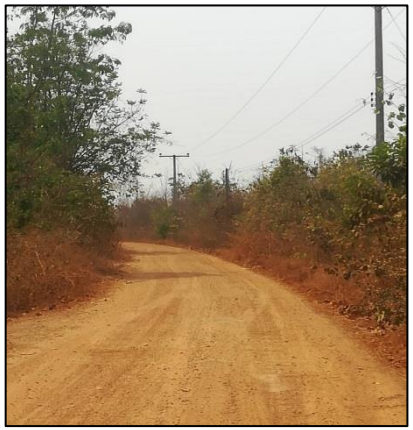
สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	พื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ โครงการ **งบประมาณ ๒๑,๓๕๑,๐๐๐ บาท**
 	**โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการโดยการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองหนองหญ้าลัด บ้านวังไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการขุดลอกคลองแม่รำพัน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไม้กอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๔,๑๐๔,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๓ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
 	**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนบัวจรัส หมู่ที่ ๓ ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๔๕๗,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๘ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข ๒๕๒๗ คลองพฤกษา หมู่ที่ ๕ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย **งบประมาณ ๖๒๑,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการโดยการขุดสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๑๔ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓๖๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
 	**โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการโดยการขุดสระประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๕๙๑,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๑๔ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓๑๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข ๒๕๒๗ คลองกระถิน หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (จุดที่ ๑) งบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐ บาท (จัดสรร) **ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข ๒๕๒๗ คลองกระถิน หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (จุดที่ ๒) งบประมาณ ๖๒๓,๐๐๐ บาท (จัดสรร) **ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองสองตอน - หนองจิกตีนเนิน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๕,๓๗๔,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๙ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓,๖๔๘,๙๔๖ บาท ผลการเบิกจ่าย - ดำเนินการแล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย **งบประมาณ ๓,๔๒๔,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน : รอลงนามในสัญญา** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๗๕๔,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๔ มี.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๕๗๘,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ดำเนินการแล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
 	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้านตลุกช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง** ลงนามในสัญญา - วงเงินตามสัญญา - ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** **-**

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
  	**<u>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ</u>** ๑. สำหรับงานประเภทก่อสร้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดทำป้ายบอกแหล่งงบประมาณ จำนวนวงเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. มีหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและบางโครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ซึ่งอาจจะทำให้ผลการดำเนินโครงการล่าช้า ๓. การขุดลอกหรือการก่อสร้างถนน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ควรนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ๔. การซ่อมแซมถนนที่มีลักษณะเป็น Asphaltic Concrete เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สิ่งสำคัญคือการทำไหล่ทางให้รถขนส่งทางการเกษตร ลงไปยังที่ทำการเกษตรได้ เพื่อป้องกันการชำรุดของถนน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙
