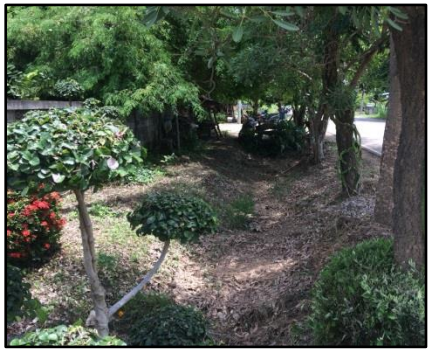
สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

งบพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	พื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๙,๙๑๔,๓๐๐ บาท
  	**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ถนนสายบ้านท่าวิเศษ - บ้านชัยมงคล บ้านท่าวิเศษ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๕๙๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๓๙,๘๕๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
  	**โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ (ลำเหมืองกลางดง) ชุมชนกลางดงสาม หมู่ที่ ๓ - ชุมชนกลางดงสอง หมู่ที่ ๒ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๒๓ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๔๑,๕๐๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
 	**โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ - ๓.๐๐ x ๓.๐๐ ม. หมู่ที่ ๘ บ้านนาแพะ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๕ ส.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๘๖๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ (ลำเหมือง สาย ๒ และสาย ๓) ชุมชนใหม่ดอนสว่าง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๕ ส.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๔๕๕,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑๘,๓๑๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักบริเวณถนนสายท่าวิเศษ-น้ำด้วน** **หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๙๕๓,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๕ มิ.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๖๘๓,๓๒๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๐๒,๔๙๘ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค -**

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
 	**โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ (Cape Seal) หมู่ที่ ๖ สายท่าไม้แดง ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย** **งบประมาณ ๒,๔๑๒,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๒๙ พ.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ (Cape Seal) สายห้วยตาด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๙๑๗,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๒๕ มิ.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๙๘,๐๐๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหัวฝาย หมู่ที่ ๗ ซอยอุบาลี ๒๐ ต. กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๓๖๓,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๔ ก.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๘๙๕,๔๙๑ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๓๔,๓๒๔ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
 	**โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ถนนทุ่งพริกสาย ๑ ช่วง กม.๑+๒๐๐ - กม.๒+๒๑๐ ชุมชนเหมืองนา ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๑๐.๐๐ เมตร** **งบประมาณ ๑,๕๙๗,๘๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๒๙ พ.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๙๕๒,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล ถนนเด่นป่ายางสาย ๑ ตอน ๒ ช่วง กม.๐+๓๕๐ - กม.๒+๑๔๕ - ชุมชนเหมืองนา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๗๙๕.๐๐ เมตร** **งบประมาณ ๒,๓๖๑,๕๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๒๙ พ.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
 	**โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายเด่นโคงาม หมู่ที่ ๑ ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๒๘ มิ.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชุมชนกลางดงเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนแม่บ่อทอง หมู่ที่ ๖ ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๒๘ มิ.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๒๖๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย - ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ - เด่นจี้ ตำบลดงกลาง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๔ ก.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๒๔๖,๔๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘๖,๖๙๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
 	**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเชิงผา หมู่ที่ ๑๑ ชุมชนโป่งฝาง หมู่ที่ ๔ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๕,๐๗๘,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๔ ก.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓,๓๔๙,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕๐๒,๓๕๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -
 	**โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ทางสาย หมู่ที่ ๗ (บ้านเด่นดีหมี - บ้านคลองสำราญ ตำบลไทยชนะศึก) ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย** **งบประมาณ ๑,๖๘๓,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๒ สิ้นสุด ๑๕ เม.ย.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๑,๑๖๕,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๑๗๔,๗๕๐ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
	พื้นที่อำเภอทุ่งเสลียม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม **งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท**
    	**โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมหลัก : ยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมย่อย : ปรับปรุงเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๔๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนหอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.๖๓+๕๗๕ - กม.๖๔+๙๑๕ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง ๑.๓๔๐ กิโลเมตร** **งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (จัดสรร)** **ผลการดำเนินงาน** ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๒ สิ้นสุด ๑๙ ส.ค.๖๒ วงเงินตามสัญญา ๓๙,๓๘๔,๗๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๕,๙๐๗,๗๐๕ บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ **ปัญหา/อุปสรรค** -

รูปภาพโครงการ/กิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงาน
   	**<u>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ</u>** ๑. สำหรับงานประเภทก่อสร้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องจัดทำป้ายบอกแหล่งงบประมาณ จำนวนวงเงินตามสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. ถนนที่มีลักษณะเป็น Cape Seal เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สิ่งสำคัญคือการทำไหล่ทางให้รถเพื่อการเกษตร ลงพื้นที่ทำการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเกี่ยวข้าวที่เป็นล้อตีนตะขาบ เมื่อเวลากลับรถหรือหมุนรถลงที่นา จะส่งผลให้ถนนบริเวรนั้นชำรุด ๓. การก่อสร้างถนนเนื่องจากเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถนนจะมีสภาพดี ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนใช้ความเร็วมากขึ้น แต่ยังขาดป้ายบอกจุดเสี่ยง จุดอันตรายทางแยก ทางร่วมและทางโค้งต่างๆ ดังนั้น จึงขอให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเร่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มาดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙
